



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung, Bali

Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

NAMA KEGIATAN :

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

NAMA PEKERJAAN :

LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP

BACKUP DATA

MC - 0

NOMOR KONTRAK	: <u>023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024</u>
	ESJ-P2408-10230235
TGL. KONTRAK	: 05 SEPTEMBER 2024
NOMOR MC-0	: 023.VIII/UNI14.8/PL/BA-MC0/2024
TGL. MC-0	: 25 SEPTEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN	: 2024

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

KONTRAKTOR

CV. ADI PUTRA

PERHITUNGAN MC - 0

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan
PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP
LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TGL. KONTRAK : 05 September 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00
KONTRAKTOR : CV.Adi Putra
KONSULTAN PENGAWAS : CV. Adiguna Karma Konsultan

NO ITEM	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	VOLUME KONTRAK			PERNITUNGN MC.0			PERNITUNGN ADDENDUM-II			PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT	VOLUME	JUMLAH HARGA	VOLUME	JUMLAH HARGA	
					(Rupiah)	%		(Rupiah)	%		(Rupiah)	%		(Rupiah)		(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7=6 / RC x 100	8	9 = 4 x 8	10=9/RC x 100	11	12 = 4 x 11	13=12/RC x 100	14 = 11 - 8	15 = 4 x 14	16 = 8 - 11	17 = 16 x 4	18
DIVISI 1	UMUM																
1	Mobilisasi																
1	Mobilisasi	LS	23,200,000.00	1.00	23,200,000.00	0.942	1.00	23,200,000.00	0.942				-	-	-	-	
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				-	-		-	-				-	-	-	-	
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	17,500,000.00	1.00	17,500,000.00	0.710	1.00	17,500,000.00	0.710				-	-	-	-	
1.19	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja				-	-		-	-				-	-	-	-	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	17,500,000.00	1.00	17,500,000.00	0.710	1.00	17,500,000.00	0.710				-	-	-	-	
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 2	DRAINASE				-	-		-	-				-	-	-	-	
2.5.(1a)	Penyediaan dan Pemasangan Box Culvert Tipe 80/80	M1	3,190,700.00	9.60	30,630,720.00	1.243	32.40	103,378,680.00	4.196				22.80	72,747,960.00			
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				-	-		-	-				-	-	-	-	
3.1.(3)	Galian Batu	M3	99,650.00	471.00	46,935,150.00	1.905	455.02	45,342,743.00	1.840						15.98	1,592,407.00	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	65,300.00	471.00	30,756,300.00	1.248	455.02	29,712,806.00	1.206						15.98	1,043,494.00	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	225,300.00	44.00	9,913,200.00	0.402	377.66	85,087,108.79	3.454				333.66	75,173,908.79			
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	13,390.00	1,806.00	24,182,340.00	0.982	1,613.48	21,604,497.20	0.877						192.52	2,577,842.80	
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR				-	-		-	-				-	-	-	-	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	699,600.00	361.00	252,555,600.00	10.251	322.66	225,732,936.00	9.162						38.34	26,822,664.00	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	604,000.00	395.00	238,580,000.00	9.684	388.22	234,484,880.00	9.518				(6.78)	(4,095,120.00)			
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL				-	-		-	-				-	-	-	-	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	27,500.00	1,777.00	48,867,500.00	1.983	1,613.24	44,364,100.00	1.801						163.76	4,503,400.00	
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	28,200.00	267.00	7,529,400.00	0.306	269.20	7,591,440.00	0.308				2.20	62,040.00			
6.3(5a).1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,847,200.00	158.50	292,781,200.00	11.884	151.70	280,220,240.00	11.374						6.80	12,560,960.00	
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,714,900.00	238.00	408,146,200.00	16.566	204.43	350,577,007.00	14.230						33.57	57,569,193.00	
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 7	STRUKTUR				-	-		-	-				-	-	-	-	
7.1 (7a)	Beton Strukur, f'c'20 MPa	M3	1,877,240.00	190.00	356,675,600.00	14.477	148.25	278,300,830.00	11.296						41.75	78,374,770.00	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	16,930.00	369.00	6,247,170.00	0.254	183.96	3,114,442.80	0.126						185.04	3,132,727.20	
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	16,930.00	995.00	16,845,350.00	0.684	292.44	4,951,009.20	0.201						702.56	11,894,340.80	
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8	Kg	19,800.00	6,091.00	120,601,800.00	4.895	4,922.20	97,459,560.00	3.956						1,168.80	23,142,240.00	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	910,000.00	125.80	114,478,000.00	4.647	153.80	139,958,000.00	5.681				28.00	25,480,000.00			

NO ITEM	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	VOLUME KONTRAK			PERMITUNGN MC.0			PERMITUNGN ADDENDUM-II			PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		KETERANGAN
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rupiah)	BOBOT %	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rupiah)	BOBOT %	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rupiah)	BOBOT %	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rupiah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rupiah)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7=6 / RC x 100	8	9 = 4 x 8	10=9/RC x 100	11	12 = 4 x 11	13=12/RC x 100	14 = 11 - 8	15 = 4 x 14	16 = 8 - 11	17 = 16 x 4	18
					-	-		-	-				-	-	-	-	
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				-	-		-	-				-	-	-	-	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	223,000.00	66.50	14,829,500.00	0.602	72.81	16,236,630.00	0.659				6.31	1,407,130.00			
	Pemindahan Gardu dan Tiang Listrik PLN	LS	220,500,000.00	1.00	220,500,000.00	8.950	1.00	220,500,000.00	8.950				-	-			
	Pemindahan Tiang Telkom	Buah	915,500.00	4.00	3,662,000.00	0.149	18.00	16,479,000.00	0.669				14.00	12,817,000.00			
	Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm	M1	643,200.00	250.00	160,800,000.00	6.527	311.60	200,421,120.00	8.135				61.60	39,621,120.00			
				JUMLAH	2,463,717,030.0	100.000		2,463,717,030.0	100.000			-	-	223,214,038.79		223,214,038.80	
																	0.00

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
 PIHAK PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PENGADAAN BARANG & KONSTRUKSI
 UNIVERSITAS PADJADJARAN


 P. LIE JASA, MT,
 NID. 19661218 199103 1 003.

DIPERIKSA OLEH :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


 IR. COK BAGUS ARIAWAN
 TEAM LEADER

DIAJUKAN OLEH :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


 I. GEDE JANGGA
 DIREKTUR

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : UMUM NO ITEM PEKJ. : 1 PEKERJAAN : Mobilisasi
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Mobilisasi		1.000	
		JUMLAH:	1.000	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>I GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

REKAPITULASI

BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan		DIVISI : UMUM	
PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP		NO ITEM PEKJ. : 1.19	
LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung		PEKERJAAN : Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
KONTRAKTOR : CV.Adi Putra			

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1.000	
		JUMLAH:	1.000	

Di Periksa Oleh :

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN



MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl

PENGAWAS LAPANGAN

Diajukan Oleh :

KONTRAKTOR

CV. ADI PUTRA



GD YOBY KARISMA CAHYADI

PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : DRAINASE NO ITEM PEKJ. : 2.5.(1a) PEKERJAAN : Penyediaan dan Pemasangan Box Culvert Tipe 80/80
--	---

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Penyediaan dan Pemasangan Box Culvert Tipe 80/80	0+025.00 s/d 0+032.20 L 0+075.60 s/d 0+084.00 L 0+119.00 s/d 0+125.00 L 0+021.00 s/d 0+032.20 R	7.200 8.400 6.000 10.800	
		JUMLAH:	32.400	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  GD YOBY KARISMA CAHYADI PELAKSANA LAPANGAN
---	---

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK NO ITEM PEKJ. : 3.1.(3) PEKERJAAN : Galian Batu
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Galian Batu	0+032.20 s/d 0+221.00 L 0+075.00 s/d 0+200.00 L	158.520 296.500	(Galian Saluran) (Galian Badan Jalan)
		JUMLAH:	455.020	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK NO ITEM PEKJ. : 3.2.(1b) PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari Hasil Galian
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	0+075.00 s/d 0+127.24 CL	455.020	
		JUMLAH:	455.020	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK NO ITEM PEKJ. : 3.2.(2a) PEKERJAAN : Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
--	---

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0+100.00 s/d 0+200.00 CL	377.661	
		JUMLAH:	377.661	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>I GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: PERKERASAN BERBUTIR
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP		
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	NO ITEM PEKJ.	: 5.1.(1)
		PEKERJAAN	: Lapis Pondasi Agregat Kelas A
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA
	
<u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	<u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: PERKERASAN BERBUTIR
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP	NO ITEM PEKJ.	: 5.1.(2)
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	PEKERJAAN	: Lapis Pondasi Agregat Kelas B
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0+025.00 s/d 0+233.60 CL 0+025.00 s/d 0+231.00 L 0+025.00 s/d 0+231.00 R	322.660 24.540 41.020	
		JUMLAH:	347.200	

Di Periksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

Diajukan Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN



GD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PERKERASAN ASPAL NO ITEM PEKJ. : 6.1 (1) PEKERJAAN : Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	0+025.00 s/d 0+233.60 CL	1613.240	
		JUMLAH:	1613.240	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>I GB YOPY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PERKERASAN ASPAL NO ITEM PEKJ. : 6.1 (2a) PEKERJAAN : Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	0+000.00 s/d 0+233.60 CL	269.200	
JUMLAH:			269.200	

Di Periksa Oleh :

KONSULTAN PENGAWAS

CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Diajukan Oleh :

KONTRAKTOR

CV. ADI PUTRA

GD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: PERKERASAN ASPAL
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP		
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	NO ITEM PEKJ.	: 6.3(6a)
		PEKERJAAN	: Laston Lapis Antara (AC-BC)
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>I GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	---

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra			DIVISI : STRUKTUR NO ITEM PEKJ. : 7.1 (7a) PEKERJAAN : Beton Strukur, fc'20 MPa	
NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Beton Strukur, fc'20 MPa	0+018.00 s/d 0+240.40 R 0+031.80 s/d 0+041.00 R 0+032.20 s/d 0+221.00 L 0+032.20 s/d 0+041.20 L	86.340 1.200 59.720 0.990	(Beton Saluran) (Beton Plat Saluran) (Beton Saluran) (Beton Plat Saluran)
		JUMLAH:	148.250	
Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN				

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : STRUKTUR NO ITEM PEKJ. : 7.3 (1) PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos-BjTP 280
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	0+031.80 s/d 0+041.00 R 0+032.20 s/d 0+041.20 L	104.800 79.160	(Besi Beton Plat Saluran) (Besi Beton Plat Saluran)
		JUMLAH:	183.960	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA
 <u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	 <u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra			DIVISI : STRUKTUR NO ITEM PEKJ. : 7.3 (2) PEKERJAAN : Baja Tulangan Sirip BjTS 280	
NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	0+031.80 s/d 0+041.00 R 0+032.20 s/d 0+041.20 L	160.500 131.940	(Besi Beton Plat Saluran) (Besi Beton Plat Saluran)
		JUMLAH:	292.440	
Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>GD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN				

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: STRUKTUR
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP	NO ITEM PEKJ.	: 7.3 (8)
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	PEKERJAAN	: Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8	0+018.00 s/d 0+240.40 R 0+032.20 s/d 0+221.00 L	2926.830 1995.370	(Besi Saluran Beton) (Besi Saluran Beton)
		JUMLAH:	4922.200	

Di Periksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN



MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Diajukan Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



Yoby Karisma Cahyadi
PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : STRUKTUR NO ITEM PEKJ. : 7.9.(1) PEKERJAAN : Pasangan Batu
--	---

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Pasangan Batu	0+167.00 s/d 0+167.00 R 0+167.00 s/d 0+261.20 R 0+027.00 s/d 0+069.50 L 0+069.50 s/d 0+072.80 L	17.170 48.380 9.980 22.690	
		JUMLAH:	153.800	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  <u>I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl</u> PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  <u>IGD YOBY KARISMA CAHYADI</u> PELAKSANA LAPANGAN
---	--

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP	NO ITEM PEKJ.	: 9.2.(1)
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	PEKERJAAN	: Marka Jalan Termoplastik
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Marka Jalan Termoplastik	0+100.00 s/d 0+233.60 CL 0+000.00 s/d 0+075.60 L 0+084.00 s/d 0+119.00 L 0+125.00 s/d 0+233.60 L 0+000.00 s/d 0+233.60 R 0+000.00 s/d 0+100.00 CL	6.480 9.070 4.200 13.030 28.030 12.000	(Garis Putus-putus) (Garis Menerus) (Garis Menerus) (Garis Menerus) (Garis Menerus) (Garis Menerus)
		JUMLAH:	72.810	

Di Periksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

Diajukan Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN



I GD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN : Belanja Modal Gedung dan Bangunan PEKERJAAN : Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP LOKASI : Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung KONTRAKTOR : CV.Adi Putra	DIVISI : PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN NO ITEM PEKJ. : 9.2.(1) PEKERJAAN : Pemindahan Gardu dan Tiang Listrik PLN
--	--

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Pemindahan Gardu dan Tiang Listrik PLN	0+230.60 s/d 0+233.60 R 0+000.00 s/d 0+233.60 R	0.600 0.400	
		JUMLAH:	1.000	

Di Periksa Oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN  MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl PENGAWAS LAPANGAN	Diajukan Oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA  GD YOBY KARISMA CAHYADI PELAKSANA LAPANGAN
---	--

**REKAPITULASI
BACK UP DATA PENDUKUNG BALANCE SHEET**

KEGIATAN	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan	DIVISI	: PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
PEKERJAAN	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP	NO ITEM PEKJ.	: 9.2.(1)
LOKASI	: Kampus Unud Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Kab. Badung	PEKERJAAN	: Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm
KONTRAKTOR	: CV.Adi Putra		

NO.	URAIAN	LOKASI (STA)	VOLUME (M3)	KETERANGAN
1	Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm	0+167.00 s/d 0+167.00 R 0+167.00 s/d 0+261.20 R 0+027.00 s/d 0+069.50 L 0+069.50 s/d 0+072.80 L	57.900 136.700 42.500 74.500	
		JUMLAH:	311.600	

Di Periksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

Diajukan Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN



GD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : Mobilisasi

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUAN- TITAS	HARGA		PROSENTASE THD SUB ITEM (%)	KET
				SATUAN PEKERJAAN	JUMLAH		
				(Rp)	(Rp)		
B.	PERALATAN						
2	ASPHALT FINISHER	Unit	1.00	610,500.00	610,500.00	0.026	
4	BULLDOZER 100-150 HP	Unit	1.00	610,500.00	610,500.00	0.026	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	Unit	1.00	122,100.00	122,100.00	0.005	
9	DUMP TRUCK 6-8 M3	Unit	1.00	183,150.00	183,150.00	0.008	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	Unit	2.00	610,500.00	1,221,000.00	0.051	
12	GENERATOR SET	Unit	1.00	366,300.00	366,300.00	0.015	
13	MOTOR GRADER >100 HP	Unit	1.00	610,500.00	610,500.00	0.026	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	Unit	1.00	610,500.00	610,500.00	0.026	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	Unit	2.00	610,500.00	1,221,000.00	0.051	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	Unit	1.00	610,500.00	610,500.00	0.026	
20	CONCRETE VIBRATOR	Unit	1.00	61,050.00	61,050.00	0.003	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	Unit	1.00	183,150.00	183,150.00	0.008	
25	TAMPER	Unit	1.00	61,050.00	61,050.00	0.003	
26	JACK HAMMER	Unit	1.00	60,995.00	60,995.00	0.003	
				-		-	
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas						
1	Kantor Lapangan dan Fasilitas	M2	16.00	610,500.00	9,768,000.00	0.411	
				-			
E.	MOBILISASI PERSONIL						
1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS	1.00	5,494,500.00	5,494,500.00	0.231	
				-			
G.	DEMOBILISASI	LS	1.00	1,959,705.00	1,959,705.00	0.082	
	SUB TOTAL	LS			23,754,500.00	1.000	
	TOTAL KUMULATIF	LS			23,754,500.00	1.000	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN



MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA



GS YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN							
KEGIATAN	:	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
PEKERJAAN	:	LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP					
LOKASI	:	KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG					
KONTRAKTOR	:	CV. ADI PUTRA					
NOMOR KONTRAK	:	023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024					
		ESJ-P2408/10230235					
TANGGAL KONTRAK	:	05 SEPTEMBER 2024					
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.463.717.030,00					
URAIAN PEKERJAAN		:	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUAN- TITAS	HARGA		PROSENTASE THD SUB ITEM (%)	KET
				SATUAN PEKERJAAN	JUMLAH		
				(Rp)	(Rp)		
C.	PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS						
1	Rambu Batas Kecepatan	Buah	2.00	805,860.00	1,611,720.00	0.090	
2	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	Buah	2.00	805,860.00	1,611,720.00	0.090	
10	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	Buah	2.00	805,860.00	1,611,720.00	0.090	
13	Traffic Cone	Buah	2.00	293,040.00	586,080.00	0.033	
14	Police Line	Buah	1.00	95,215.04	95,215.04	0.005	
16	Lampu Sementara	Buah	2.00	248,937.48	497,874.96	0.028	
20	Tongkat Pengatur Lalu Lintas	Buah	2.00	54,945.00	109,890.00	0.006	
21	Lampu Putar (Rotary Lamp)	Buah	2.00	109,890.00	219,780.00	0.012	
24	Peralatan komunikasi dan Lainnya	Sel	2.00	4,273,500.00	8,547,000.00	0.476	
D.	TENAGA / PERSONIL						
1	Pekerja (Flagman)	OB	1.00	3,052,500.00	3,052,500.00	0.170	
SUB TOTAL		LS			17,943,500.00	1.000	
TOTAL KOMULATIF		LS			17,943,500.00	1.000	
Diperiksa oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN				Dibuat oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA			
 I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp PENGAWAS LAPANGAN				 I SD YOBY KARISMA CAHYADI PELAKSANA LAPANGAN			


[illegible]

PERHITUNGAN Kuantitas Pekerjaan

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 2.5.(1a) Penyediaan dan Pemasangan Box Culvert Tipe 80/80

GAMBAR / SKETSA

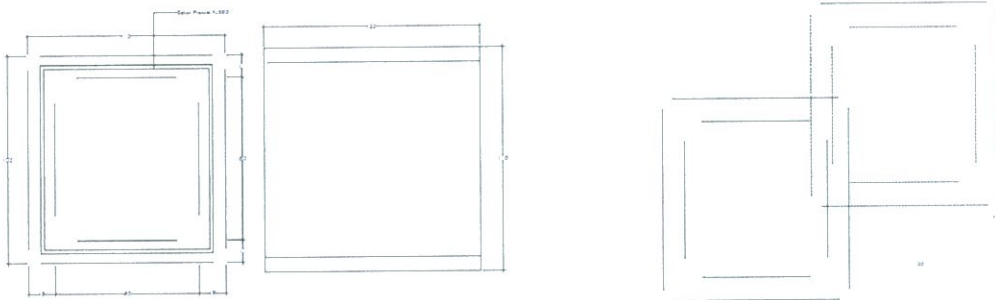

NO.	STATION	LAJUR (L / R)	PANJANG (M1)	DIMENSI					LUAS		VOLUME (M1)	KET
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER		JUMLAH	UNIT		
				(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	
1	0 + 075.60 s/d 0 + 084.00	L	8.40	1.20	1.10	1.02			7.00		8.40	
2	0 + 119.00 s/d 0 + 125.00	L	6.00	1.20	1.10	1.02			5.00		6.00	
3	0 + 021.00 s/d 0 + 031.80	R	10.80	1.20	1.10	1.02			9.00		10.80	
4	0 + 025.00 s/d 0 + 032.20	L	7.20	1.20	1.10	1.02			6.00		7.20	
Sub Total			32.40								32.40	
Total Kumulatif			32.40								32.40	

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



IG YOPY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 3.1.(3) Galian Batu

GAMBAR / SKETSA

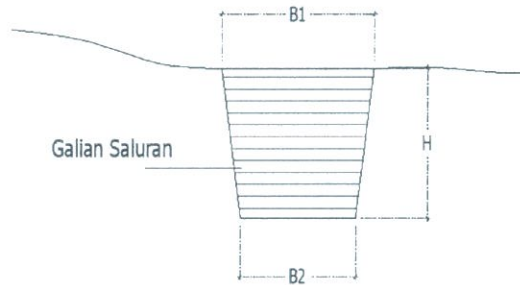

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI						LUAS		VOLUME	KET
				B0	B1	B2	B3	H	H1	UNIT	RATA2		
		(L / R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M2)	(M2)	(M3)	
1	0 + 032.20 s/d	R	17.80		1.10	1.10		0.50		0.55	0.550	9.79	Type 80
2	0 + 050.00 s/d	R	25.60		1.10	1.10		0.50		0.55	0.550	14.08	Type 80
	0 + 075.60				1.10	1.10		0.50		0.55			
3	0 + 032.20 s/d	L	17.80		1.10	1.10		0.95		1.05	1.050	18.69	Type 80
4	0 + 050.00 s/d	L	25.60		1.10	1.10		0.95		1.05	1.050	26.88	Type 80
	0 + 075.60				1.10	1.10		0.95		1.05			
5	0 + 084.00 s/d	L	16.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	10.88	Type 60
6	0 + 100.00 s/d	L	19.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	12.92	Type 60
	0 + 119.00				0.90	0.90		0.75		0.68			
7	0 + 125.00 s/d	L	25.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	17.00	Type 60
8	0 + 150.00 s/d	L	25.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	17.00	Type 60
9	0 + 175.00 s/d	L	25.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	17.00	Type 60
10	0 + 200.00 s/d	L	21.00		0.90	0.90		0.75		0.68	0.680	14.28	Type 60
	0 + 221.00				0.90	0.90		0.75		0.68			
Sub Total			217.80									158.52	
Total Kumulatif			217.80									158.52	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA

MD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

URAIAN PEKERJAAN : 3.1.(3) Galian Batu

GAMBAR / SKETSA



Diperiksa oleh : KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spi
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh : KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA

GD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

URAIAN PEKERJAAN : 3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Hasil Galian

GAMBAR / SKETSA

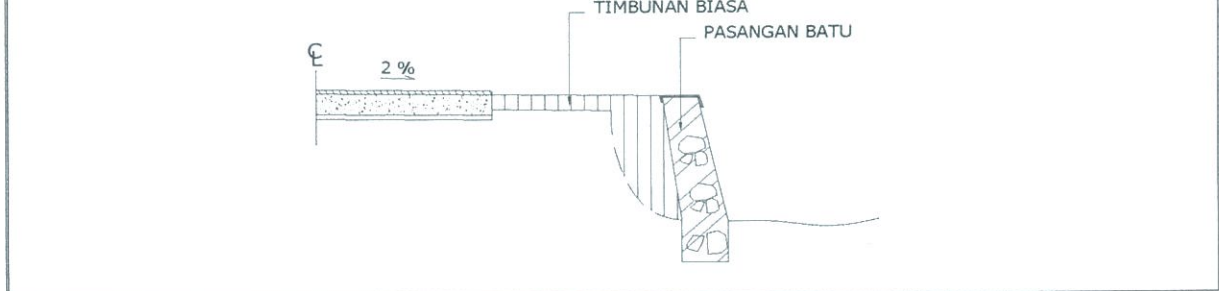

Diperiksa oleh : KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spi
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh : KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


GD YOPY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

GAMBAR / SKETSA

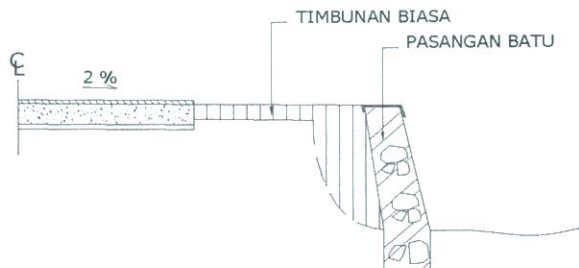

NO	STA.	LAJUR (L / CL / R)	PANJANG (M')	LEBAR			TINGGI H1 (M')	LUAS		VOLUME (M3)	KET.
				Atas B0 (M')	Bawah B1 (M')	Rata - rata ΣB/2 (M')		LUAS (M2)	Rata - rata (M2)		
				(M')	(M')	(M')		(M2)	(M2)		
	0+100.00			7.10	7.10	7.10	0.20	1.42			
3	s/d	CL	25.00	7.10	7.10	7.10	0.50	3.55	2.49	62.13	
4	0+125.00	CL	25.00	7.13	7.13	7.13	0.60	4.28	3.91	97.85	
5	s/d	CL	25.00	7.20	7.20	7.20	0.60	4.32	4.30	107.48	
6	0+175.00	CL	25.00	7.50	7.50	7.50	0.60	4.50	4.41	110.20	
	0+200.00										
Sub Total			100.00							377.66	
Total Kumulatif			100.00							377.66	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


 MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


 IGD YOSY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN	: BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN	: LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI	: KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR	: CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK	: <u>023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024</u>
	: ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK	: 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK	: Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

SKETSA / GAMBAR

[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


I GD TOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A

SKETSA / GAMBAR



NO	STA.	LAJUR (L / CL / R)	PANJANG (M1)	LEBAR		LUAS (M2)	TINGGI (M1)	VOLUME (M3)	KET.
				LEBAR (M1)	Rata - rata (M1)				
	0+025.00			7.00					
1	s/d	CL	25.00	7.25	7.25	181.25	0.20	36.25	
	0+050.00			7.50					
2	s/d	CL	25.00	8.08	8.08	201.88	0.20	40.38	
	0+075.00			8.65					
3	s/d	CL	25.00	8.08	8.08	201.88	0.20	40.38	
	0+100.00			7.50					
4	s/d	CL	25.00	7.50	7.50	187.50	0.20	37.50	
	0+125.00			7.50					
5	s/d	CL	25.00	7.50	7.50	187.50	0.20	37.50	
	0+150.00			7.50					
6	s/d	CL	25.00	7.50	7.50	187.50	0.20	37.50	
	0+175.00			7.50					
7	s/d	CL	25.00	7.50	7.50	187.50	0.20	37.50	
	0+200.00			7.50					
8	s/d	CL	25.00	7.50	7.50	187.50	0.20	37.50	
	0+225.00			7.50					
9	s/d	CL	8.60	10.55	10.55	90.73	0.20	18.15	
	0+233.60			13.60					
Sub Total			208.60					322.66	
Total Kumulatif			208.60					322.66	

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



GD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

SKETSA / GAMBAR

[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


I G D YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN	: BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN	: LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI	: KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR	: CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK	: <u>023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024</u> ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK	: 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK	: Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

SKETSA / GAMBAR

[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN


IGDYOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

SKETSA / GAMBAR

[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.SpI
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


I GD YOPY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 TANGGAL KONTRAK : ESJ-P2408/10230235
 NILAI KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

SKETSA / GAMBAR



NO	STA.	PANJANG (M1)	LAJUR (L / CL / R)	LEBAR		LUAS (M1)	KOEFSISIEN		VOLUME (M3)	KET.
				LEBAR (M1)	Rata - rata (M1)		UNIT (Ltr / M2)	Rata - rata (Ltr / M2)		
	0+025.00			7.00			1.00			
1	s/d	25.00	CL		7.25	181.25		1.00	181.25	
	0+050.00			7.50			1.00			
2	s/d	25.00	CL		8.08	201.88		1.00	201.88	
	0+075.00			8.65			1.00			
3	s/d	25.00	CL		8.08	201.88		1.00	201.88	
	0+100.00			7.50			1.00			
4	s/d	25.00	CL		7.50	187.50		1.00	187.50	
	0+125.00			7.50			1.00			
5	s/d	25.00	CL		7.50	187.50		1.00	187.50	
	0+150.00			7.50			1.00			
6	s/d	25.00	CL		7.50	187.50		1.00	187.50	
	0+175.00			7.50			1.00			
7	s/d	25.00	CL		7.50	187.50		1.00	187.50	
	0+200.00			7.50			1.00			
8	s/d	25.00	CL		7.50	187.50		1.00	187.50	
	0+225.00			7.50			1.00			
9	s/d	8.60	CL		10.55	90.73		1.00	90.73	
	0+233.60			13.60			1.00			
Sub Total		208.60				1,613.24			1,613.24	
Total Kumulatif		208.60				1,613.24			1,613.24	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


IGGYBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN										
KEGIATAN	:	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN								
PEKERJAAN	:	LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP								
LOKASI	:	KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG								
KONTRAKTOR	:	CV. ADI PUTRA								
NOMOR KONTRAK	:	023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024								
	:	ESJ-P2408/10230235								
TANGGAL KONTRAK	:	05 SEPTEMBER 2024								
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.463.717.030,00								
URAIAN PEKERJAAN	:	6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi								
SKETSA / GAMBAR										
NO	STA.	PANJANG (M)	LAJUR (L / CL / R)	LEBAR		LUAS (M ²)	KOEFSISIEN		VOLUME (M ³)	KET.
				LEBAR (M)	Rata - rata (M)		UNIT (Ltr / M ²)	Rata - rata (Ltr / M ²)		
1	0+000.00 s/d 0+025.00	25.00	CL	7.50	7.25	181.25	0.15	0.15	27.19	
2	0+025.00 s/d 0+050.00	25.00	CL	7.50	7.25	181.25	0.15	0.15	27.19	
3	0+050.00 s/d 0+075.00	25.00	CL	7.50	8.08	201.88	0.15	0.15	30.28	
4	0+075.00 s/d 0+100.00	25.00	CL	8.65	8.08	201.88	0.15	0.15	30.28	
5	0+100.00 s/d 0+125.00	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.15	0.15	28.13	
6	0+125.00 s/d 0+150.00	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.15	0.15	28.13	
7	0+150.00 s/d 0+175.00	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.15	0.15	28.13	
8	0+175.00 s/d 0+200.00	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.15	0.15	28.13	
9	0+200.00 s/d 0+225.00	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.15	0.15	28.13	
10	0+225.00 s/d 0+233.60	8.60	CL	7.50	10.55	90.73	0.15	0.15	13.61	
Sub Total				233.60		1,794.49			269.20	
Total Kumulatif				233.60		1,794.49			269.20	
Diperiksa oleh : KONSULTAN PENGAWAS CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl PENGAWAS LAPANGAN Dibuat oleh : KONTRAKTOR CV. ADI PUTRA GD YORY KARISMA CAHYADI PELAKSANA LAPANGAN										

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNID BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.YIMUN14.BEL.KONSPEP2024
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.830,00

GAMBAR / SKETSA



URAIAN PEKERJAAN : 6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)

NO	TANGGAL PRODUKSI	STA.	PANJANG	LAJUR	LEBAR		LUAS		TEBAL CORE DRILL								VOLUME	BERAT JENIS (JMF)	DENSITY LAP. %	DENSITY RATA 2 %	FAKTOR KOREKSI ASPAL	BERAT JENIS LAPANGAN						KADAR ASPAL (JMF)	KADAR ASPAL				VOLUME TONASE	PAVER TES TAKE COAT	VOLUME TAKE COAT	Campuran AC - WC	KET.			
					AC - WC	RATA-RATA	RATA-RATA	(L)	(CL L)	(CL R)	(R)	RATA- RATA	DEBAYAR	(m)	(m)	(m3)						(m3)	(L)	(CL L)	(CL R)	(R)	RATA- RATA		DEBAYAR	EXTRACT 1	EXTRACT 2	RATA- RATA						DEBAYAR	TERKORELASI	LTR / M2
			(m)	(L / CL / R)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Ton)	LTR / M2	(LTR)	(Ton)									
1		0+025.00 sds	25.00	CL	7.00	7.25	181.25	0.04	0.06			0.06	0.06	10.88	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				22.98	-	22.98					
2		0+050.00 sds	25.00	CL	7.50	8.08	201.88					0.06	0.06	12.11	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				25.58	-	25.58					
3		0+075.00 sds	25.00	CL	8.65	8.08	201.88					0.06	0.06	12.11	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				25.58	-	25.58					
4		0+100.00 sds	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.04	0.06			0.06	0.06	11.26	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				23.76	-	23.76					
5		0+125.00 sds	25.00	CL	7.50	7.50	187.50					0.06	0.06	11.26	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				23.76	-	23.76					
6		0+150.00 sds	25.00	CL	7.50	7.50	187.50					0.06	0.06	11.26	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				23.76	-	23.76					
7		0+175.00 sds	25.00	CL	7.50	7.50	187.50					0.06	0.06	11.26	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				23.76	-	23.76					
8		0+200.00 sds	25.00	CL	7.50	7.50	187.50	0.04	0.06			0.06	0.06	11.26	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				23.76	-	23.76					
9		0+225.00 sds	8.60	CL	7.50	10.55	90.73					0.06	0.06	5.44	2.112						100.00						2.112	2.112	5.900				11.49	-	11.49					
		0+233.60			13.60																																			

Diperiksa oleh:
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KIRMA KONSULTAN

IMDO DEVA RATU PUTRA, S.Ti, S2i
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh:
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


IDRIS KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.1 (7a) Beton Strukur, $f_c'20$ MPa

GAMBAR / SKETSA

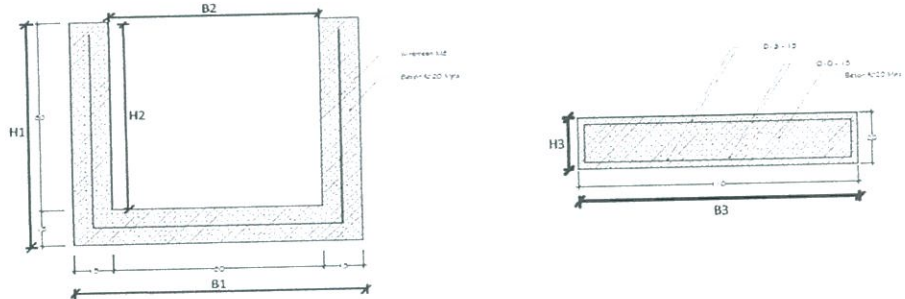

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI						LUAS		VOLUME	KET	
				B1	B2	B3	H1	H2	H3	UNIT	RATA2			
				(L / R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M2)	(M2)	(M3)		
1	0 + 018.00 s/d	R	2.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	0.82	Type 80	
	0 + 020.00			1.10	0.80		0.95	0.80		0.41			Type 80	
													Type 80	
	0 + 031.80 s/d	R	18.20	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	7.46	Type 80	
	0 + 050.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
3	0 + 075.00 s/d			1.10	0.80		0.95	0.80		0.41		10.25	Type 80	
4	0 + 075.00 s/d	R	25.00								0.41		Type 80	
	0 + 100.00 s/d			1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
5	0 + 125.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41		10.25	Type 80	
6	0 + 150.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
7	0 + 175.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
8	0 + 200.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
9	0 + 225.00 s/d	R	25.00	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	10.25	Type 80	
10	0 + 240.40 s/d	R	15.40	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41	0.41	6.31	Type 80	
	0 + 031.80 s/d					1.10			0.12	0.13				
11	0 + 041.00 s/d	R	9.20								0.13	1.20	Type 80	
	0 + 041.00					1.10			0.12	0.13				
Sub Total			219.80										87.54	
Total Kumulatif			219.80										87.54	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


 MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA



 IGD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.1 (7a) Beton Strukur, $f_c'20$ MPa

GAMBAR / SKETSA

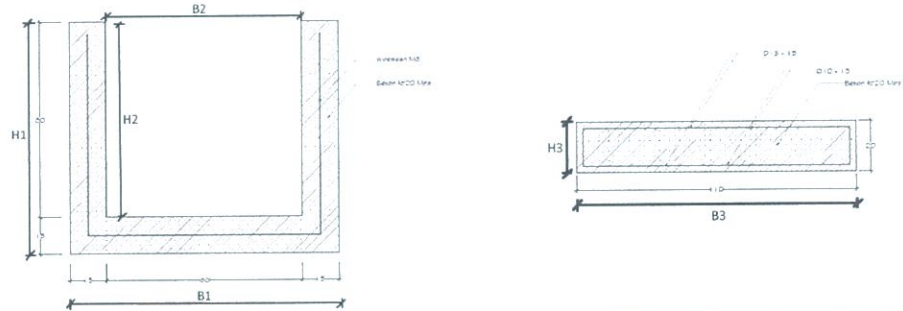

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI						LUAS		VOLUME	KET
		B1		B2	B3	H1	H2	H3	UNIT	RATA2			
		(L / R)		(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M2)	(M2)	(M3)		
1	0 + 032.20	L	17.80	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41		7.30	Type 80
	s/d								0.41		Type 80		
2	0 + 050.00	L	25.60	1.10	0.80		0.95	0.80		0.41		10.50	Type 80
	s/d								0.41		Type 80		
3	0 + 084.00	L	16.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		5.12	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
4	0 + 100.00	L	19.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		6.08	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
5	0 + 125.00	L	25.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		8.00	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
6	0 + 150.00	L	25.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		8.00	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
7	0 + 175.00	L	25.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		8.00	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
8	0 + 200.00	L	21.00	0.90	0.60		0.75	0.60		0.32		6.72	Type 60
	s/d								0.32		Type 60		
9	0 + 032.20	L	9.00			0.90			0.12	0.11		0.99	Type 60
	s/d				0.90		0.12	0.11					
Sub Total			183.40									60.71	
Total Kumulatif			403.20									148.25	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


GS YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280

SKETSA / GAMBAR

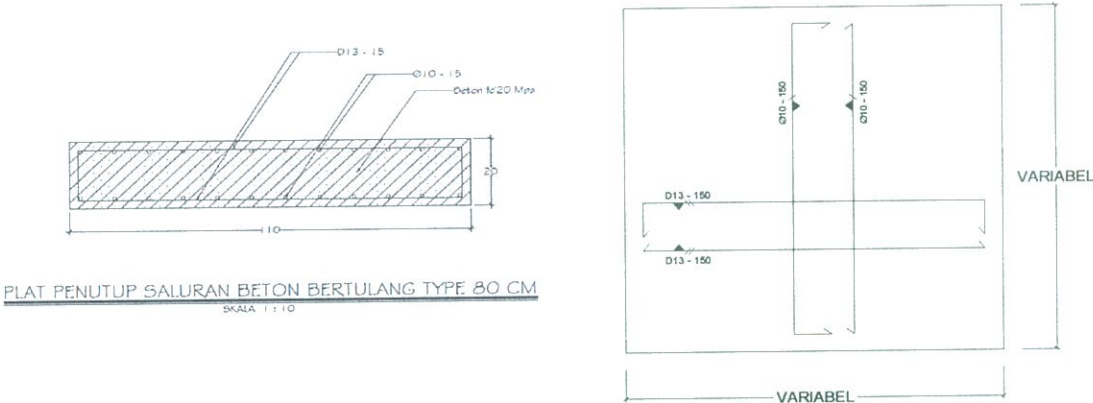

NO	STA.	LAJUR	BESI	PANJANG BESI	BANYAKNYA	BERAT	VOLUME	KET.
		(L / CL / R)	(mm)	(M')	(Btng)	(Kg/m')	(Kg)	
1	0 +031.80 s/d	R	Ø 10 - 150	9.39	9.0	0.62	52.40	BESI PLAT TYPE 80
	0 +041.00		Ø 10 - 150	9.39	9.0	0.62	52.40	PADA SALURAN
2	0+032.20 s/d	L	Ø 10 - 150	9.19	7.0	0.62	39.88	BESI PLAT TYPE 60
	0+041.20		Ø 10 - 150	9.05	7.0	0.62	39.28	PADA SALURAN

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

IMD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spi
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA



GD YOEY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.B/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.3 (2) Baja Tulangan Sirip BJTS 280

SKETSA / GAMBAR

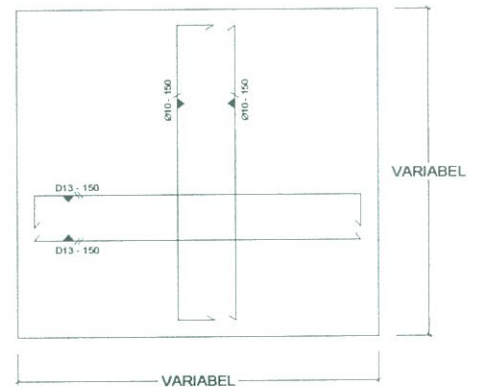

NO	STA.	LAJUR	BESI	PANJANG BESI	BANYAKNYA	BERAT	VOLUME	KET.
		(L / CL / R)	(mm)	(M')	(Btng)	(Kg/m')	(Kg)	
1	0+031.80	R	D 12 - 150	1.35	62.3	1.03	86.67	BESI PLAT
	s/d							TYPE 80
	0+041.00		D 12 - 150	1.15	62.3	1.03	73.83	PADA SALURAN
2	0+032.20	L	D 12 - 150	1.15	61.0	1.03	72.25	BESI PLAT
	s/d							TYPE 60
	0+041.20		D 12 - 150	0.95	61.0	1.03	59.69	PADA SALURAN

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.SpI
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


I GO YOEY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.3 (8) Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8

SKETSA / GAMBAR

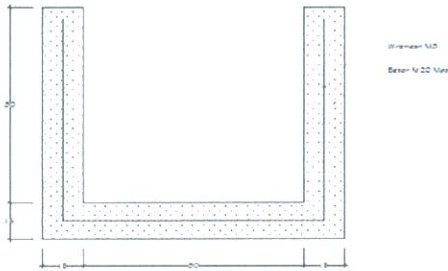

NO	STA.	LAJUR	PANJANG BESI	BESI	LEBAR	LUAS	BERAT	VOLUME	KET.
		(L / CL / R)	(M')	(mm)	(M')	(M2)	(Kg/m2)	(Kg)	
1	0 + 018.00								
	s/d	R	2.00	Wiremesh M8	2.55	5.10	5.45	27.80	Saluran Type 80
	0 + 020.00								
2	0 + 031.80								
	s/d	R	18.20	Wiremesh M8	2.55	46.41	5.45	252.93	Saluran Type 80
3	0 + 050.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
4	0 + 075.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
5	0 + 100.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
6	0 + 125.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
7	0 + 150.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
8	0 + 175.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
9	0 + 200.00								
	s/d	R	25.00	Wiremesh M8	2.55	63.75	5.45	347.44	Saluran Type 80
10	0 + 225.00								
	s/d	R	15.40	Wiremesh M8	2.55	39.27	5.45	214.02	Saluran Type 80
	0 + 240.40								
Sub Total			210.60					2,926.83	
Total Kumulatif			210.60					2,926.83	

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.SpI
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


I Gdhyoty KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JUN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.3 (8) Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8

SKETSA / GAMBAR

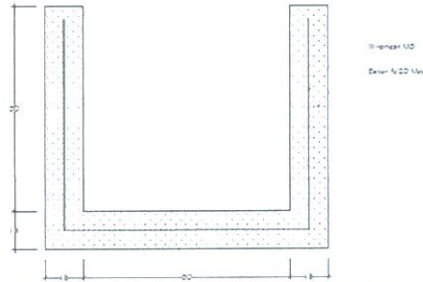

NO	STA.	LAJUR	PANJANG BESI	BESI	LEBAR	LUAS	BERAT	VOLUME	KET.
		(L / CL / R)	(M')	(mm)	(M')	(M ²)	(Kg/m ²)	(Kg)	
1	0 + 032.20								
	s/d	L	17.80	Wiremesh M8	2.55	45.39	5.45	247.38	Saluran Type 80
2	0 + 050.00								
	s/d	L	25.60	Wiremesh M8	2.55	65.28	5.45	355.78	Saluran Type 80
3	0 + 084.00								
	s/d	L	16.00	Wiremesh M8	1.95	31.20	5.45	170.04	Saluran Type 60
4	0 + 100.00								
	s/d	L	19.00	Wiremesh M8	1.95	37.05	5.45	201.92	Saluran Type 60
5	0 + 125.00								
	s/d	L	25.00	Wiremesh M8	1.95	48.75	5.45	265.69	Saluran Type 60
6	0 + 150.00								
	s/d	L	25.00	Wiremesh M8	1.95	48.75	5.45	265.69	Saluran Type 60
7	0 + 175.00								
	s/d	L	25.00	Wiremesh M8	1.95	48.75	5.45	265.69	Saluran Type 60
8	0 + 200.00								
	s/d	L	21.00	Wiremesh M8	1.95	40.95	5.45	223.18	Saluran Type 60
	0 + 221.00								
Sub Total			174.40					1,995.37	
Total Kumulatif			385.00					4,922.20	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


MD DEVA BATU PUTRA, S.Tr.Sp!
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA



GD YORY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

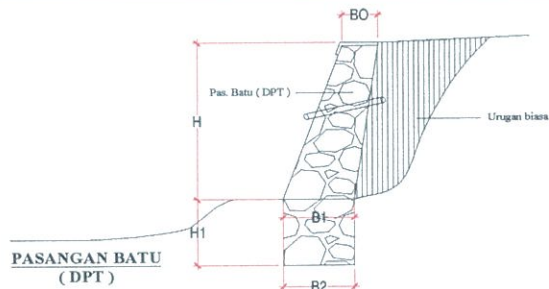

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI					LUAS		VOLUME	KET
				B0	B1	B2	H	H1	UNIT	RATA2		
		L / CL / R	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M2)	(M2)	(M3)		
	O + 167.00			0.30	0.40		1.00		0.35			Melintang
1	s/d	R	5.40							0.39	2.11	Jalan
	O + 167.00			0.30	0.40	1.20	0.42					
2	O + 167.00	R	2.50	0.30	0.40		1.00		0.35	0.39	0.98	Melintang
	s/d								Jalan			
3	O + 167.00	R	2.50	0.30	0.40		1.20		0.42	0.32	0.80	Melintang
	O + 167.00			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
4	s/d	R	2.50	0.30	0.40		1.00		0.35	0.30	0.75	Melintang
	O + 167.00			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
5	O + 167.00	R	5.00	0.30	0.40		0.90		0.32	0.28	1.40	Melintang
	s/d			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
6	O + 167.00	R	5.00	0.30	0.40		0.80		0.28	0.32	1.60	Melintang
	s/d			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
7	O + 167.00	R	15.00	0.30	0.40		1.00		0.35	0.25	3.75	Melintang
	s/d			0.30	0.40	0.60	0.21		Jalan			
8	O + 167.00	R	2.50	0.30	0.40		0.80		0.28	0.35	0.88	Melintang
	s/d			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
9	O + 167.00	R	17.50	0.30	0.40		1.20		0.42	0.28	4.90	Melintang
	s/d			0.30	0.40	0.80	0.28		Jalan			
	O + 167.00			0.30	0.40		0.80		0.28			
Sub Total			57.90	Sub Total							17.17	
Total Kumulatif			57.90	Total Kumulatif							17.17	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


YDY YORY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

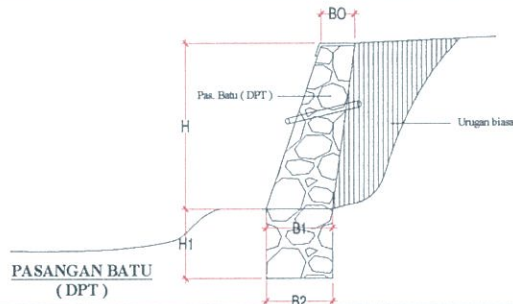

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI					LUAS		VOLUME	KET
				B0	B1	B2	H	H1	UNIT	RATA2		
		L / CL / R	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M2)	(M2)	(M3)	
	0 + 167.00			0.30	0.40		1.60		0.56			
10	s/d	R	24.70	0.30	0.40		1.60		0.56	0.56	13.83	
	0 + 191.70			0.30	0.40		1.60		0.56			
	0 + 191.70			0.30	0.40		1.60		0.56			
11	s/d	R	25.00	0.30	0.40		1.60		0.56	0.56	14.00	
	0 + 216.70			0.30	0.40		1.60		0.56			
	0 + 216.70			0.30	0.40		2.10		0.74			
12	s/d	R	17.00	0.30	0.40		2.10		0.74	0.74	12.58	
	0 + 233.70			0.30	0.40		2.10		0.74			
	0 + 233.70			0.30	0.40		2.10		0.74			
13	s/d	R	15.00	0.30	0.40		1.60		0.56	0.65	9.75	
	0 + 248.70			0.30	0.40		1.60		0.56			
	0 + 248.70			0.30	0.40		1.60		0.56			
14	s/d	R	2.50	0.30	0.40		1.30		0.46	0.51	1.28	
	0 + 251.20			0.30	0.40		1.30		0.46			
	0 + 251.20			0.30	0.40		1.30		0.46			
15	s/d	R	2.50	0.30	0.40		0.90		0.32	0.39	0.98	
	0 + 253.70			0.30	0.40		1.20		0.42			
	0 + 253.70			0.30	0.40		1.20		0.42			
16	s/d	R	2.50	0.30	0.40		1.00		0.35	0.39	0.98	
	0 + 256.20			0.30	0.40		1.20		0.42			
	0 + 256.20			0.30	0.40		1.20		0.42			
17	s/d	R	2.50	0.30	0.40		1.10		0.39	0.41	1.03	
	0 + 258.70			0.30	0.40		1.10		0.39			
	0 + 258.70			0.30	0.40		1.50		0.53			
18	s/d	R	2.50	0.30	0.40		1.10		0.39	0.46	1.15	
	0 + 261.20			0.30	0.40		1.10		0.39			
Sub Total			94.20						Sub Total		55.58	
Total Kumulatif			152.10						Total Kumulatif		72.75	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.SpI
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


GD YOPY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KOTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

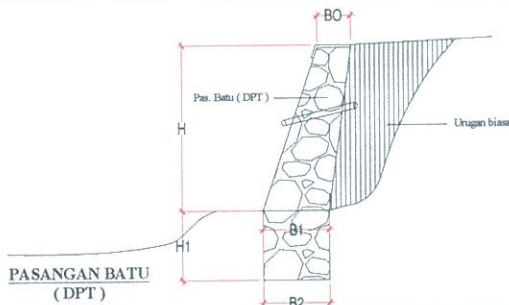[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PRATRA


IGD YOPY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JUN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

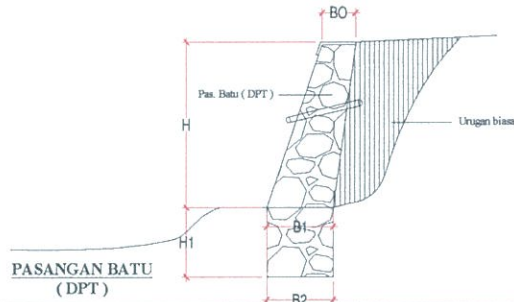

NO.	STATION	LAJUR L / CL / R	PANJANG (M)	DIMENSI					LUAS		VOLUME (M3)	KET
				B0 (M)	B1 (M)	B2 (M)	H (M)	H1 (M)	UNIT (M2)	RATA2 (M2)		
27	0 + 027.00 s/d 0 + 032.00	L	5.00	0.30	0.40		0.60		0.21	0.21	1.05	
28	0 + 032.00 s/d 0 + 039.50	L	7.50	0.30	0.40		0.70		0.25	0.25	1.88	
29	0 + 039.50 s/d 0 + 044.50	L	5.00	0.30	0.40		0.80		0.28	0.27	1.35	
30	0 + 044.50 s/d 0 + 052.00	L	7.50	0.30	0.40		0.80		0.28	0.25	1.88	
31	0 + 052.00 s/d 0 + 057.00	L	5.00	0.30	0.40		0.80		0.28	0.23	1.15	
32	0 + 057.00 s/d 0 + 059.50	L	2.50	0.30	0.40		0.60		0.21	0.21	0.53	
33	0 + 059.50 s/d 0 + 062.00	L	2.50	0.30	0.40		0.60		0.21	0.21	0.53	
34	0 + 062.00 s/d 0 + 064.50	L	2.50	0.30	0.40		0.60		0.21	0.21	0.53	
35	0 + 064.50 s/d 0 + 067.00	L	2.50	0.30	0.40		0.70		0.25	0.22	0.55	
36	0 + 067.00 s/d 0 + 069.50	L	2.50	0.30	0.40		0.50		0.18	0.21	0.53	
Sub Total			42.50	Sub Total							9.98	
Total Kumulatif			304.40	Total Kumulatif							131.11	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp.
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


I GD YORY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JUN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

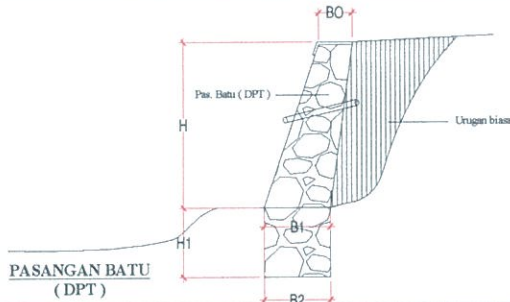

NO.	STATION	LAJUR L / CL / R	PANJANG (M)	DIMENSI					LUAS		VOLUME (M3)	KET
				B0 (M)	B1 (M)	B2 (M)	H (M)	H1 (M)	UNIT (M2)	RATA2 (M2)		
	O + 069.50			0.30	0.40		0.70		0.25			
37	s/d	L	8.30							0.24	1.99	
	O + 077.80			0.30	0.40		0.65		0.23			
	O + 077.80			0.30	0.40		0.70		0.25			
38	s/d	L	2.50							0.25	0.63	
	O + 075.30			0.30	0.40		0.70		0.25			
	O + 075.30			0.30	0.40		0.90		0.32			
39	s/d	L	2.50							0.32	0.80	
	O + 072.80			0.30	0.40		0.90		0.32			
	O + 072.80			0.30	0.40		1.10		0.39			
40	s/d	L	7.50							0.39	2.93	
	O + 065.30			0.30	0.40		1.10		0.39			
	O + 065.30			0.30	0.40		1.30		0.46			
41	s/d	L	7.50							0.43	3.23	
	O + 057.80			0.30	0.40		1.10		0.39			
	O + 057.80			0.30	0.40		0.70		0.25			
42	s/d	L	1.20							0.25	0.30	
	O + 056.60			0.30	0.40		0.70		0.25			
	O + 056.60			0.30	0.40		0.70		0.25			
43	s/d	L	2.50							0.29	0.73	
	O + 054.10			0.30	0.40		0.90		0.32			
	O + 054.10			0.30	0.40		0.90		0.32			
44	s/d	L	2.50							0.34	0.85	
	O + 051.60			0.30	0.40		1.00		0.35			
	O + 051.60			0.30	0.40		0.70		0.25			
45	s/d	L	2.50							0.25	0.63	
	O + 049.10			0.30	0.40		0.70		0.25			
	O + 049.10			0.30	0.40		0.60		0.21			
46	s/d	L	5.00							0.25	1.25	
	O + 044.10			0.30	0.40		0.80		0.28			
Sub Total			42.00	Sub Total							13.34	
Total Kumulatif			346.40	Total Kumulatif							144.45	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


GD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 7.9.(1) Pasangan Batu

GAMBAR / SKETSA

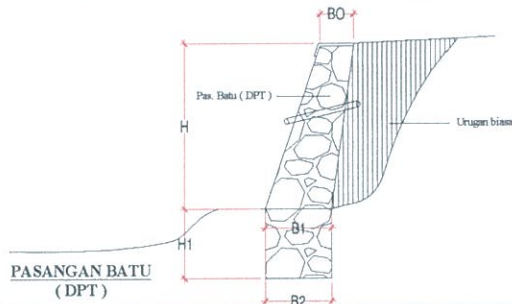

NO.	STATION	LAJUR L / CL / R	PANJANG (M)	DIMENSI					LUAS		VOLUME (M3)	KET
				B0 (M)	B1 (M)	B2 (M)	H (M)	H1 (M)	UNIT (M2)	RATA2 (M2)		
	0 + 044.10			0.30	0.40		0.70		0.25			
47	s/d	L	5.00	0.30	0.40		0.80		0.28	0.27	1.35	
	0 + 039.10			0.30	0.40		0.70		0.25			
48	s/d	L	5.00	0.30	0.40		0.90		0.32	0.29	1.45	
	0 + 034.10			0.30	0.40		0.70		0.25			
49	s/d	L	2.50	0.30	0.40		1.00		0.35	0.30	0.75	
	0 + 031.60			0.30	0.40		0.70		0.25			
50	s/d	L	2.50	0.30	0.40		0.80		0.28	0.30	0.75	
	0 + 029.10			0.30	0.40		0.80		0.28			
51	s/d	L	2.50	0.30	0.40		0.90		0.32	0.32	0.80	
	0 + 026.60			0.30	0.40		0.80		0.28			
52	s/d	L	5.00	0.30	0.40		0.90		0.32	0.30	1.50	
	0 + 026.60			0.30	0.40		0.80		0.28			
53	s/d	L	5.00	0.30	0.40		0.90		0.32	0.30	1.50	
	0 + 026.60			0.30	0.40		0.70		0.25			
54	s/d	L	5.00	0.30	0.40		0.70		0.25	0.25	1.25	
	0 + 026.60			0.30	0.40							
Sub Total			32.50	Sub Total							9.35	
Total Kumulatif			378.90	Total Kumulatif							153.80	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


 MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA




 GO YOPY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P240810230235
TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik

SKETSA / GAMBAR



TPK	ANALISA (Jumlah)	DETAIL
RL 1 (Dash Line)	1 GARIS AS 1 GARIS POKOK JALAN	
RL 2 (Solid Line)	1 GARIS AS 1 GARIS BAWAH 1 GARIS POKOK JALAN 1 GARIS POKOK JALAN	
DL 4	1 GARIS POKOK CHEVRON	

NO	STA.	LAJUR	PANJANG (M')	LEBAR MARKA (M')	LEBAR RATA-RATA (M')	PANJANG MARKA (Kg/m')	JUMMLAH (Bh)	LUAS (M2)	KET.
		(L / CL / R)							
	Garis As Jalan (Dash Line)								
	0+100.00			0.12					
1	s/d 0+233.60	CL	133.60	0.12	0.12	3.00	18.00	6.48	Garis Putus-Putus
	Garis Menerus (Solid Line)								
	0+000.00			0.12					
2	s/d 0+075.60	L	75.60	0.12	0.12	75.60		9.07	Garis Pinggir
	0+084.00			0.12					
3	s/d 0+119.00	L	35.00	0.12	0.12	35.00		4.20	Garis Pinggir
	0+125.00			0.12					
4	s/d 0+233.60	L	108.60	0.12	0.12	108.60		13.03	Garis Pinggir
	0+000.00			0.12					
5	s/d 0+233.60	R	233.60	0.12	0.12	233.60		28.03	Garis Pinggir
	0+000.00			0.12					
6	s/d 0+100.00	CL	100.00	0.12	0.12	100.00		12.00	Garis AS
Sub Total			686.40					72.81	
Total Kumulatif			686.40					72.81	

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


IGD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN	: BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEKERJAAN	: LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
LOKASI	: KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
KONTRAKTOR	: CV. ADI PUTRA
NOMOR KONTRAK	: <u>023.VIII/UN14.3/PL/KONS/SP/2024</u> ESJ-P2408/10230235
TANGGAL KONTRAK	: 05 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK	: Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pemindahan Gardu dan Tiang Listrik PLN

GAMBAR / SKETSA

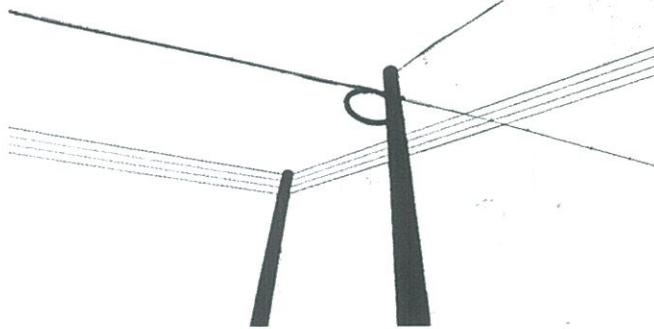[illegible]

Diperiksa oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR
CV. ADI PUTRA


IGD YOBY KARISMA CAHYADI
PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JUN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pemindahan Tiang Telkom

GAMBAR / SKETSA

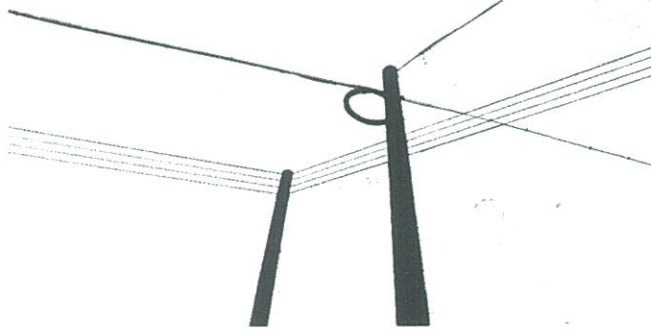

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI						LUAS		VOLUME	KET
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER		JUMLAH	UNIT	RATA2		
				(L / R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)		(BH)	(M2)		
	Pemindahan Tiang Telkom												
2	0 + 000.00 s/d 0 + 233.60	R	233.60							18.00		18.00	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

IMD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


IGD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

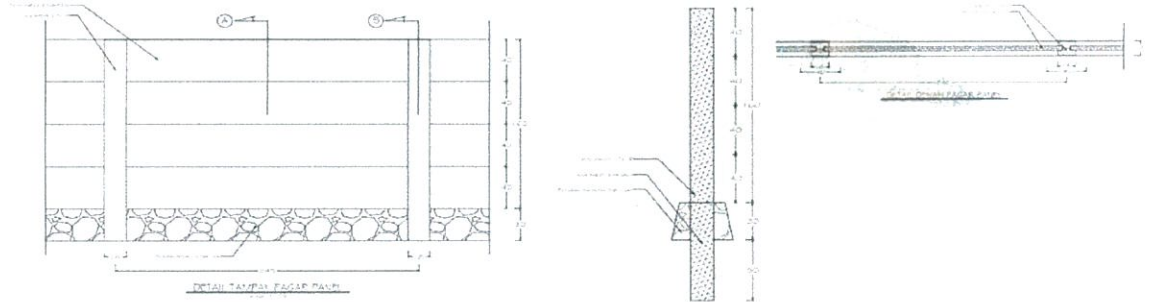

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				LUAS		VOLUME	KET
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER	JUMLAH	RATA2		
		(L / R)	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	(BH)	(M2)	(M3)	
Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm											
1	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	5.40							5.40	
2	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	2.50							2.50	
3	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	2.50							2.50	
4	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	2.50							2.50	
5	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	5.00							5.00	
6	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	5.00							5.00	
7	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	15.00							15.00	
8	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	2.50							2.50	
9	0 + 167.00 s/d 0 + 167.00	R	17.50							17.50	
Sub Total			57.90							57.90	
Total Kumulatif			57.90							57.90	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp/

PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA

IQ YOBY HARISMA CAHYADI


PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

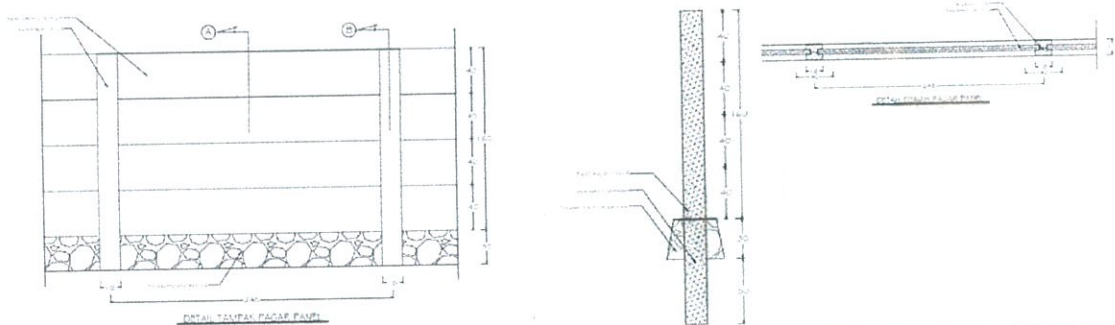

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				LUAS			VOLUME	KET	
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER	JUMLAH	UNIT	RATA2			
		(L / R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	(M3)			
Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm													
10	0 + 167.00	R	24.70								24.70		
	s/d												
	0 + 191.70												
11	0 + 191.70	R	25.00								25.00		
	s/d												
	0 + 216.70			R	17.00							17.00	
0 + 216.70													
s/d													
13	0 + 233.70	R	15.00								15.00		
	0 + 233.70												
	s/d												
14	0 + 248.70	R	2.50								2.50		
	s/d												
	0 + 251.20												
15	0 + 251.20	R	2.50								2.50		
	s/d												
	0 + 253.70												
16	0 + 253.70	R	2.50								2.50		
	s/d												
	0 + 256.20			R	2.50							2.50	
0 + 256.20													
s/d													
18	0 + 258.70	R	2.50								2.50		
	0 + 258.70												
	s/d												
	0 + 261.20												
Sub Total			94.20									94.20	
Total Kumulatif			152.10									152.10	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

I MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sdi
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


I GD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

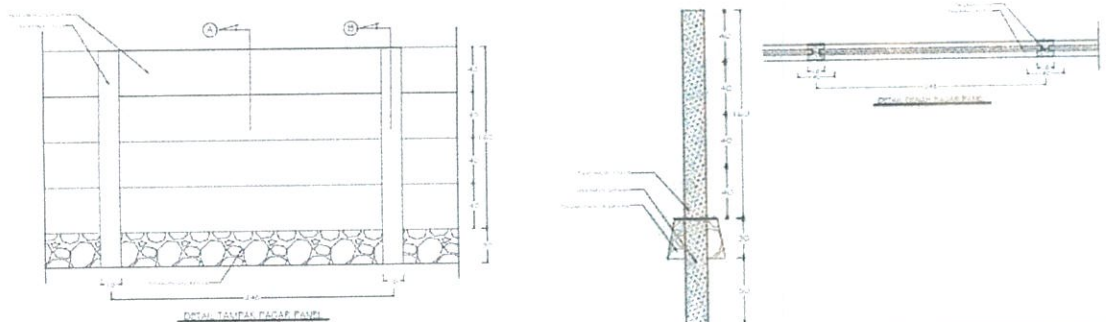

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				JUMLAH	LUAS		VOLUME	KET
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER		UNIT	RATA2		
		(L/R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	(M3)	
Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm												
	0 + 218.00											
19	s/d	R	2.50								2.50	
	0 + 220.50											
	0 + 220.50											
20	s/d	R	10.00								10.00	
	0 + 230.50											
21	0 + 230.50	R	5.00								5.00	
	s/d											
	0 + 235.50											
22	0 + 235.50	R	7.50								7.50	
	s/d											
	0 + 243.00											
	0 + 243.00											
23	s/d	R	2.50								2.50	
	0 + 245.50											
	0 + 245.50											
24	s/d	R	15.00								15.00	
	0 + 260.50											
Sub Total			42.50								42.50	
Total Kumulatif			194.60								194.60	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


MD YOPY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

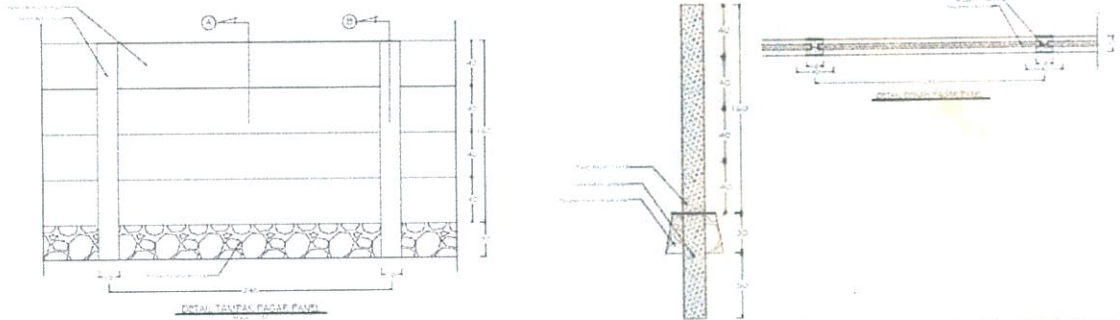

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				LUAS			VOLUME	KET	
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER	JUMLAH	UNIT	RATA2			
		(L/R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	(M3)			
	Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm												
25	0 + 027.00 s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 032.00 0 + 032.00												
26	s/d	L	7.50									7.50	
27	0 + 039.50 0 + 039.50 s/d	L	5.00									5.00	
28	0 + 044.50 0 + 044.50 s/d	L	7.50									7.50	
	0 + 052.00												
29	0 + 052.00 s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 057.00 0 + 057.00												
30	s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 059.50 0 + 059.50												
31	s/d	L	2.50									2.50	
32	0 + 062.00 0 + 062.00 s/d	L	2.50									2.50	
33	0 + 064.50 0 + 064.50 s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 067.00												
34	0 + 067.00 s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 069.50												
Sub Total			42.50									42.50	
Total Kumulatif			237.10									237.10	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA


IG DYBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

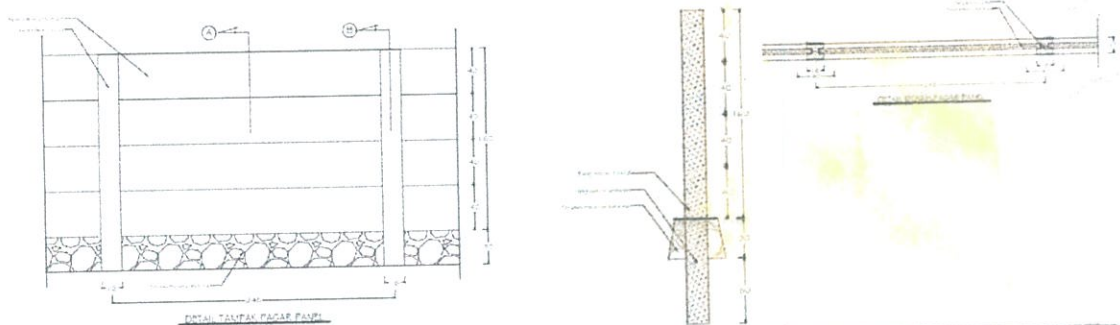

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				LUAS			VOLUME	KET	
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER	JUMLAH	UNIT	RATA2			
		(L/R)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	(M3)		
	Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm												
	0 + 069.50											8.30	
35	s/d	L	8.30										
	0 + 077.80												
	0 + 077.80												
36	s/d	L	2.50									2.50	
37	0 + 075.30 0 + 075.30 s/d	L	2.50									2.50	
38	0 + 072.80 0 + 072.80 s/d	L	7.50									7.50	
	0 + 065.30												
39	0 + 065.30 s/d	L	7.50									7.50	
	0 + 057.80												
	0 + 057.80												
40	s/d	L	1.20									1.20	
	0 + 056.60												
	0 + 056.60												
41	s/d	L	2.50									2.50	
42	0 + 054.10 0 + 054.10 s/d	L	2.50									2.50	
43	0 + 051.60 0 + 051.60 s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 049.10												
44	0 + 049.10 s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 044.10												
Sub Total			42.00									42.00	
Total Kumulatif			279.10									279.10	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN


 MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Spl
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA



 MD YOBY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN

PERHITUNGAN KUANTITAS PEKERJAAN

KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 PEKERJAAN : LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
 LOKASI : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN KUTA SELATAN, KAB. BADUNG
 KONTRAKTOR : CV. ADI PUTRA
 NOMOR KONTRAK : 023.VIII/JUN14.8/PL/KONS/SP/2024
 ESJ-P2408/10230235
 TANGGAL KONTRAK : 05 SEPTEMBER 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 2.463.717.030,00

URAIAN PEKERJAAN : 9.2.(1) Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm

GAMBAR / SKETSA

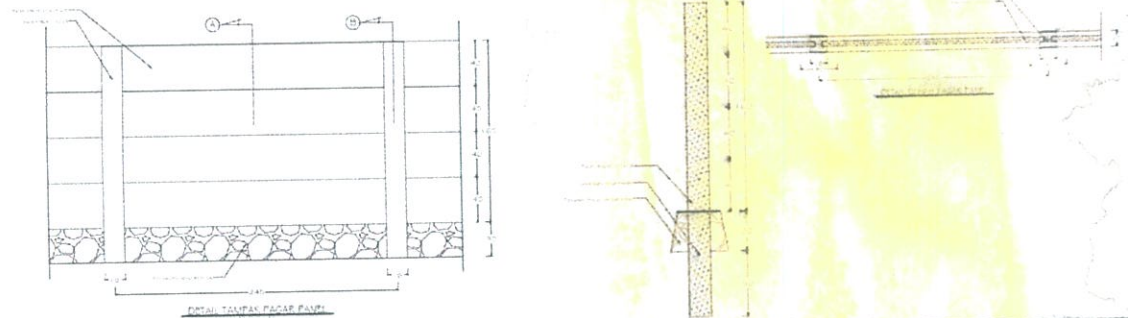

NO.	STATION	LAJUR	PANJANG	DIMENSI				LUAS			VOLUME	KET	
				PANJANG	LEBAR	TINGGI	DIAMETER	JUMLAH	UNIT	RATA2			
		(L/R)	(M)	(M1)	(M1)	(M1)	(M1)	(BH)	(M2)	(M2)	(M3)		
	Pas. Dinding Panel Beton 5x40x240cm + Kolom 17x18 cm												
45	0 + 044.10												
	s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 039.10												
46	0 + 039.10												
	s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 034.10												
47	0 + 034.10												
	s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 031.60												
48	0 + 031.60												
	s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 029.10												
49	0 + 029.10												
	s/d	L	2.50									2.50	
	0 + 026.60												
50	0 + 026.60												
	s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 026.60												
51	0 + 026.60												
	s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 026.60												
52	0 + 026.60												
	s/d	L	5.00									5.00	
	0 + 026.60												
Sub Total			32.50									32.50	
Total Kumulatif			311.60									311.60	

Diperiksa oleh :
 KONSULTAN PENGAWAS
 CV. ADIGUNA KARMA KONSULTAN

MD DEVA BAYU PUTRA, S.Tr.Sp
 PENGAWAS LAPANGAN

Dibuat oleh :
 KONTRAKTOR
 CV. ADI PUTRA

IGD YOPY KARISMA CAHYADI
 PELAKSANA LAPANGAN
